
Product backlog task	Estimert tid	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
Oppsett av database	40	20	0	0	0	
Kommunikasjon med database	20	0	0	0	0	
Innlogging	5	5	5	5	0	
Registrere timer	20	20	20	20	4	
Redigere timer	20	20	20	20	13	
Administrere prosjekter	15	15	0	0	0	
Redigere prosjekter	20	20	20	1	0	
Administrere oppgaver	40	40	40	0	0	
Teamleder	10	10	0	0	0	
Grafisk brukergrensesnitt	40	40	40	5	0	
GUI tilpasset telefoner	5	5	5	5	0	
Administrere brukere	8	8	7	0	0	
Administrere teammedlemmer	8	8	7	0	0	
Administrere grupper	15	15	15	15	0	
Administrere tilgang	20	20	20	20	0	
Rapport generering	40	40	40	40	36	
Opplæringsvideoer og artikler	10	10	10	10	10	
Godkjenne endringer i timeregistrering	15	15	15	15	15	
Sette opp sikkerhetstiltak	20	20	20	20	20	
Kalender	25	25	25	25	25	
Validering	10	10	10	10	10	
Rettigheter	20	20	20	20	0	
Dokumentasjon	100	80	60	40	20	
Testing	100	80	60	40	20	
Sum	626	546	459	311	173	
Estimert burn down		501	376	250	125	0

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 prosjekt burn down chart stor

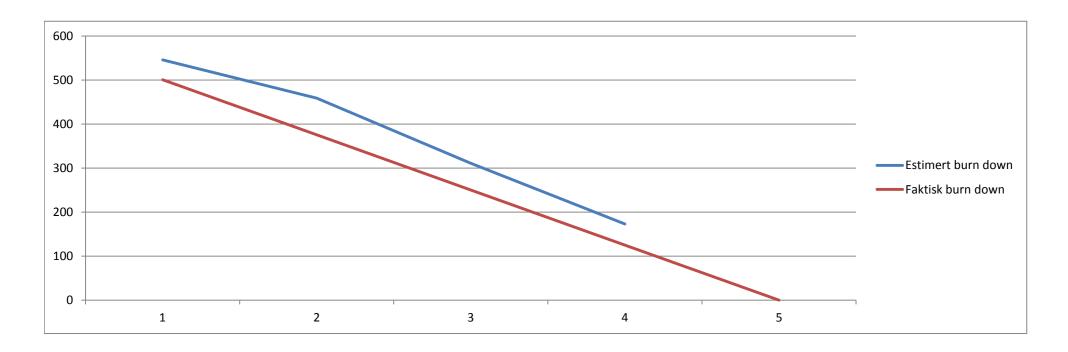

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 prosjekt burn down chart stor
